

MONTAGEPROTOKOLL CHECKLISTE

SMARTER
ARBEITEN!



QR-Code
scannen &
einfach digital
ausfüllen

HINWEIS

Das Montageprotokoll unterstützt Sie bei der Dokumentation des sach- und fachgerechten Einbaus der Quadro-Secura® Mehrspartenhauseinführung. Sie ersetzt nicht die Einbauanleitung. Wir empfehlen außerdem ausreichend Bilder der einzelnen Einbauschritte aufzubewahren, sowie die Rechnung der Quadro-Secura® und die 25-Jahre-Garantie-Urkunde.

EINBAUORT

Gebäudeart

Straße/Nr.

PLZ/Ort

DOYMA-REFERENZNUMMER

Handgeschriebene Nummer, auf dem Aufkleber des Installations-
teiles Ihrer Mehrspartenhauseinführung.

1. PRODUKT Quadro-Secura® Basic R4+

Für nicht unterkellerte Gebäude.

Welche Länge des Mantelrohres wurde eingesetzt:


3 m 6 m 10 m 15 m

2. PLATZIERUNG ROHBAUTEIL

Wurde die Einbauposition/Höhe mit dem Versorgungs-
unternehmen/Netzbetreiber abgestimmt?

(Einbauanleitung: „Allgemeine Hinweise“ Seite 2)

Ja Nein

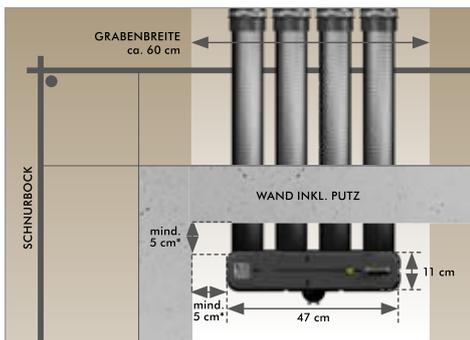


Bitte beachten Sie auch die Einbauanleitung.

3. SICHTKONTROLLE

Wurde das Mantelrohr korrekt montiert?


(Einbauanleitung: Punkt 2.6)

Ja Nein



Wurde eine Sichtkontrolle durchgeführt?

Ja Nein

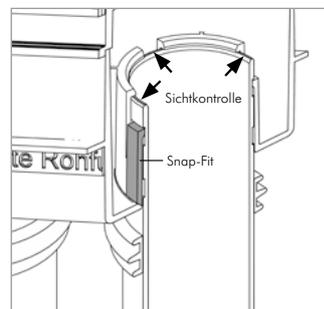

Bitte beachten Sie auch die Einbauanleitung.


WEIL SICHER EINFACH
SICHER IST.



4. AUSRICHTUNG ROHBAUTEIL

Erfolgte die Ausrichtung des Rohbauteils lage- und höhenmäßig? (Einbauanleitung: Punkt 2.12)

Ja Nein




5. BIEGERADIUS/EINSANDUNG

Wurde der Biegeradius eingehalten? (Einbauanleitung: Punkt 2.13)

Ja Nein

Wurden die Mantelrohre fachgerecht eingesandet? (Einbauanleitung: Punkt 2.13)

Ja Nein




6. SCHUTZROHRE KORREKT AUSGEFÜHRT

Wurde das biegesteife Mantelrohr mind. 1 Meter außerhalb des Gebäudegrundrisses geführt?

Ja Nein

Wir empfehlen die biegesteifen Mantelrohre ohne Verlängerung bis zur Grundstücksgrenze zu verlegen!

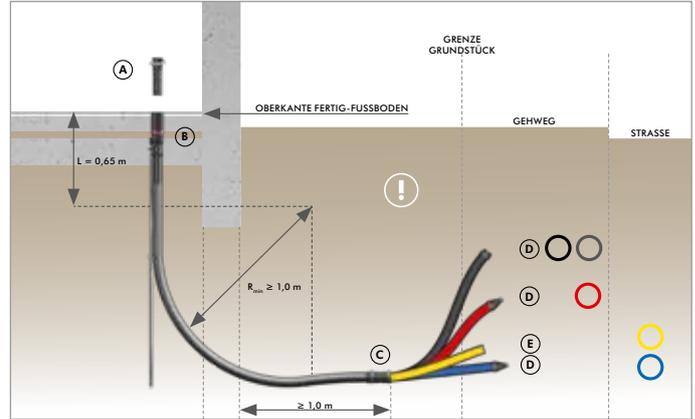

! ACHTUNG!
Im Bereich der Hausanschluss-Trasse dürfen keine Kontrollschächte, Entwässerungsrohre oder andere Leitungen verlegt werden. Eine Verlängerung der biegesteifen Schutzrohre ist – auch unter der Bodenplatte – technisch möglich. Bitte stimmen Sie sich aber hierzu in jedem Fall mit Ihrem Versorgungsunternehmen ab.

BILDER-UPLOAD – EINBAUBILDER

Mit dem Upload des Protokolls haben Sie die Möglichkeit einen Bilder-Upload zur Dokumentation vorzunehmen (Dateien bis max. 500 KB).

Es erfolgt keine Kontrolle der Daten durch DOYMA.

Es folgt daraus keine Rechtsverbindlichkeit – es handelt sich um einen Service zur Dokumentation.

Bestätigung des Sach- und Fachgerechten Einbaus nach den geltenden Einbauhinweisen:

Firma

Straße/Nr.

INSTALLATIONSTEIL EINLAGERUNG

Das Installationsteil wurde hier ein-/zwischenlagert:

Ansprechpartner

PLZ/Ort
